



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR

Resolución 16264 del 27 de noviembre de 2002

NIT: 811.018.664 DANE 305001019690

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 08 de 2026**

CUOTA 1

El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que a continuación se relacionan:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	V/R UNI	V/R TOTAL
1	91	WATIOS	Suministro, transporte e instalación de luminaria industrial tipo hermetica , con tubo LED difusor en policarbonato 2x18W T8. Chasis ea policarbonato resistente al impacto ,6500°K, 3600lm, IRC::::70, 40.000 Hora -L70, IP=-65, IK=06, 36W, 100-240V 50/60Hz. Incluye tubas Led de policarbonato, elementos defijacion (para descolgar a adosar), 1m de cable encauchetado 3x16 AWG PVC Retardant a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), prensa estopa para salida de cables hacia lummaria, conectores tipo resorte y los demas accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	\$ 141,000	\$ 12,831,000
2	91	SERV	Retiro de luminarias existentes, las luminarias retiradas se clasificaran de acuerdo con su estado, determinando su posible reutilización o disposición final conforme a los lineamientos ambientales establecidos.	\$ 27,000	\$ 2,457,000
3	4	WATIOS	Suministro e instalación de proyector led 200W Voltaje de entrada: 220-240V AC (rango común 85-305V). Grado de Protección IP: IP65 o IP66 (apto para exterior).	\$ 115,000	\$ 460,000

"Forjamos la esperanza de un mañana mejor"

CALLE 49ª N° 03ª - 006 ***** Tel: 226 73 00 - 221 61 09 MEDELLÍN



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR

Resolución 16264 del 27 de noviembre de 2002

NIT: 811.018.664 DANE 305001019690

4	2	WATIOS	Suministro e instalación de proyector led 100W Temperatura de Color: Blanco Frío (6000K - 6500K). Ángulo de Apertura: (iluminación difusa amplia). Protección IP: IP65 o IP66 (resistente a lluvia y polvo). Vida Útil: 25,000 - 30,000 horas. Voltaje de Operación: 100-240V AC (corriente alterna)	\$ 115,000	\$ 230,000
				EXENTOS / EXCLUIDOS	\$15,978,000
				GRAVADOS	\$0
				SUBTOTAL	\$15,978,000
				IVA	\$0
				TOTAL	\$15,978,000

VALOR TOTAL: **\$15,978,000**

Quince millones novecientos setenta y ocho mil Pesos

Por parte de: **EULER ENERGY S.A.S. con NIT 901257293**

Lo anterior para efectos de causacion y pago.

Medellín, 15 de mayo de 2026

Cordialmente,



BENJAMÍN MARTÍNEZ LEMOS
Rector(a)

CHECK LIST – RETIRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS

Empresa: **EULER ENERGY S.A.S**

Proyecto: **ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO EN LA INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS, PROYECTOR LED Y RETIRO DE LAMPARAS EXISTENTES EN DIFERENTES AREAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ILUMINACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.**

Ubication: **INSTITUCION EDUCATIVA ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR**

Fecha: **15/05/2026**

Responsable: **GABRIEL CETRE MOQUERA**

1. Información General

Área intervenida	AULA DE CLASES, LABORATORIO, PASILLO PRINCIPAL, ESCENARIO DEPÓRTIVO Y ZONA COMUNES
Cantidad de luminarias	91 UND
Tipo de luminaria	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMETICA , CON T:UBO LED DIFUSOR EN POLICARBONATO 2XL8W T8. CHASIS DE POLICARBONATO RESISTENTE AL IMPACTO ,6500°K, 3600LM, IRC::::70, 40.000 HORA -L70, IP=-65, IK=06.,.
Voltaje	36W, 100-240V 50/60HZ
Observaciones generales	N/A

2. Check List de Retiro de Luminarias


Ítem	Cumple	No Cumple	Observaciones
Verificación de ausencia de tensión	X	☐	
Uso de elementos de protección personal (EPP)	X	☐	
Señalización del área de trabajo	X	☐	
Desconexión segura de luminarias	X	☐	

Retiro sin daño de cableado existente	X	☐	
Disposición adecuada de luminarias retiradas	X	☐	
Verificación de estado de ductos y cajas	X	☐	

3. Check List de Instalación de Luminarias

Ítem	Cumple	No Cumple	Observaciones
Instalación conforme a RETIE	X	☐	
Verificación de fijación mecánica	X	☐	
Conexión correcta de fase, neutro y tierra	X	☐	
Prueba de funcionamiento	X	☐	
Verificación de iluminación adecuada	X	☐	
Orden y limpieza del área	X	☐	
Etiquetado y registro fotográfico	X	☐	

4. Firmas

Técnico responsable	YEHINER MONTE GOMEZ
Supervisor	GABRIEL CETRE MOQUERA
Cliente	 INSTITUCION EDUCATIVA ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR

REGISTRO FOTOGRAFICO

PASILLO ENTRADA PRICIPAL (11 UND)

ANTES



DEPUES



SALA DE PROFESORES (8 UND)

ANTES



DEPUES



AULA 120 (09 UND)

ANTES



DEPUES



AULA 121 (09 UND)

ANTES



DEPUES



AULA 122 (09 UND)

ANTES



DEPUES



AULA 123(09 UND)

ANTES



DEPUES



LABORATORIO (6 UND)
ANTES



DEPUES



AULA 105 (3 UND)

ANTES



DEPUES



AULA 206 (6 UND)

ANTES



DEPUES



AULA 207 (6 UND)

ANTES



DEPUES



AULA 208 (4 UND)

ANTES



DEPUES



AULA 209 (6 UND)

ANTES



DEPUES




AULA 210 (6 UND)

ANTES



DEPUES

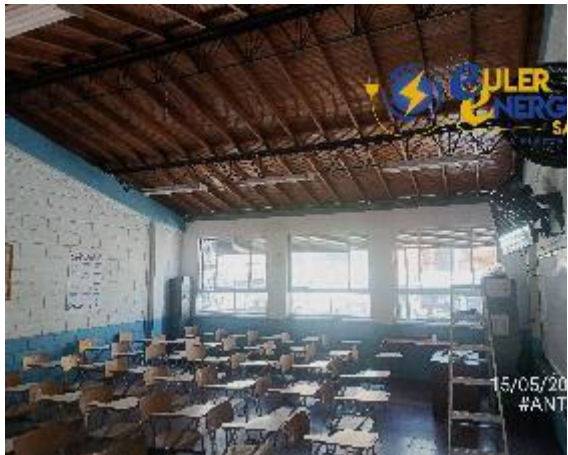

ESCENARIO DEPORTIVO
ANTES



DEPUES



**ENTRADA PPAL -Y PARQUEADERO
ANTES**



DESPUES





REGISTRO FOTOGRAFICO RETIRO- REINTEGRO DE LUMINARIAS

